

DB Station&Service AG | Regionalbereich Südwest | 11.07.2018

Sachstand Maßnahmen Engen

Terminschiene:

Aufgrund des vom EBA verfügten Planfeststellungsverfahrens und die damit verbunden Verzögerungen muss der Baubeginn auf Februar 2019 verschoben werden. Die baubetriebliche Ummeldung bei der DB Netz wurde eingeleitet.

Anstehende aktuelle Meilensteine:

Die Genehmigungsunterlagen befinden sich aktuell in der abschließenden Prüfung zur Freigabe beim Eisenbahnbundesamt.


Der Gemeinderat der Stadt Engen hat am 12.06.2018 dem Finanzierungsvertrag zugestimmt. Sobald das Planrecht von Seiten des EBA und der Förderbescheid des Landes vorliegen, kann der Finanzierungsvertrag in den Zeichnungsauflauf.

Wichtige Meilensteine:

Finanzierungsvertrag gezeichnet bis 21.09.2018

Vergabe der Bauleistung erfolgt bis 23.12.2018

Terminplan Engen

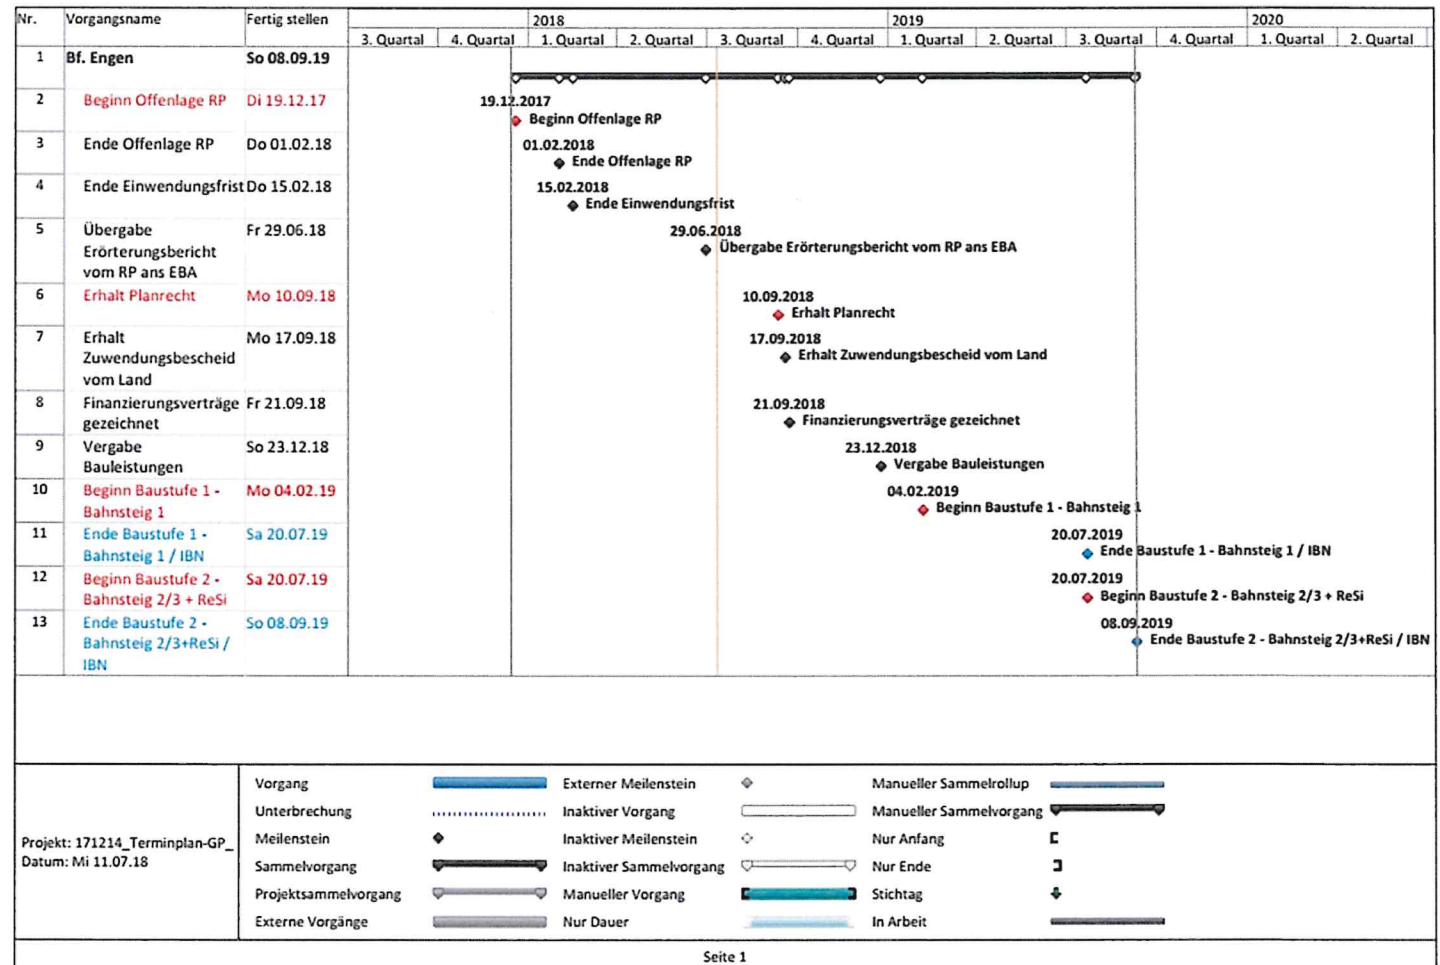



Bahnstationsmodernisierungsprogramm Baden-Württemberg

Seehas – Sachstandsbericht Station Welschingen-Neuhausen

Sachstand Maßnahmen Welschingen-Neuhausen

Terminschiene:

Aufgrund des vom EBA verfügten Planfeststellungsverfahrens und die damit verbunden Verzögerungen muss der Baubeginn auf Februar 2019 verschoben werden. Die baubetriebliche Ummeldung bei der DB Netz wurde eingeleitet.

Anstehende aktuelle Meilensteine:

Stellungnahmen zu den Einwänden an das RP wurden bereits durch DB St&S versandt.

Der Gemeinderat der Stadt Engen hat am 12.06.2018 dem Finanzierungsvertrag zugestimmt. Sobald das Planrecht von Seiten des EBA und der Förderbescheid des Landes vorliegen, kann der Finanzierungsvertrag in den Zeichnungslauf.

Wichtige Meilensteine:

Finanzierungsvertrag gezeichnet bis 21.09.2018

Vergabe der Bauleistung erfolgt bis 23.12.2018

Terminplan Welschingen-Neuhausen

